

# DECLARAȚIE DE INSTALARE CORECTĂ OPRITOARE DE CĂDERE

Referitor la lucrările de montare a dispozitivelor de ancorare împotriva căderii instalate pe imobilul situat la adresa:

Strada: \_\_\_\_\_ nr.: \_\_\_\_\_

Localitate: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_ Jud.: \_\_\_\_\_

Subsemnatul/subsemnata:

Prenume: \_\_\_\_\_ Nume: \_\_\_\_\_

Reprezentant legal al companiei: \_\_\_\_\_

cu sediul în Strada: \_\_\_\_\_ nr.: \_\_\_\_\_

Localitate: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_ Jud.: \_\_\_\_\_

declară că dispozitivele

| EN 795 | CANTITATE                | MODEL | PRODUCĂTOR | NR. DE SERIE/AN |
|--------|--------------------------|-------|------------|-----------------|
| TIP A  | <input type="checkbox"/> |       |            |                 |
| TIP C  | <input type="checkbox"/> |       |            |                 |
| TIP D  | <input type="checkbox"/> |       |            |                 |
| TIP E  | <input type="checkbox"/> |       |            |                 |

| ELEMENT DE FIXARE | DIMENSIUNI/CALITATE<br>SUBSTRAT | ADÂNCIME DE MONTARE<br>[mm] | Ø GAURĂ<br>[mm] | CUPLU DE STRÂNGERE<br>[Nm] |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
|                   |                                 |                             |                 |                            |
|                   |                                 |                             |                 |                            |
|                   |                                 |                             |                 |                            |

au fost instalate corect, conform indicațiilor producătorului și standardelor EN 795 și EN 517/B

au fost poziționate pe acoperiș, conform proiectului anexat redactat de:

Arh./Ing./Geom. \_\_\_\_\_

Conform indicațiilor furnizate în raportul de calcul anexat redactat de:

Arh./Ing./Geom. \_\_\_\_\_

Caracteristicile dispozitivelor de ancorare, instrucțiunile privind  
utilizarea corectă a acestora, fișele de control sunt în posesia:


- ☐ Proprietarului imobilului  
☐ Administratorului

Plăcuța indicatoare pentru dispozitivele de ancorare este expusă:

- ☐ în apropierea fiecărei căi de acces  
☐ \_\_\_\_\_

Data punerii în funcțiune a sistemului: \_\_\_\_\_ Data primei inspecții: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Instalator (ștampilă și semnătură): \_\_\_\_\_

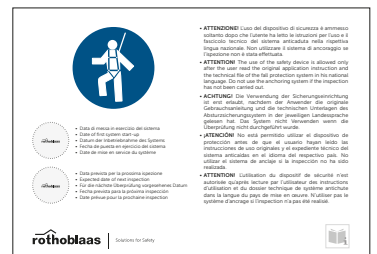

Va fi responsabilitatea proprietarului imobilului să mențină echipamentele instalate într-o stare bună pentru a asigura menținerea în timp a caracteristicilor necesare de soliditate și rezistență. Întreținerea trebuie să fie încredințată personalului calificat și efectuată în modurile și la intervalele indicate de producător.

# PROCES VERBAL DE INSPECȚIE

**PRODUCĂTOR:** Rotho Blaas srl - Via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - www.rothoblaas.com  
Tel: +39 0471 81 84 00 - Fax: +39 0471 81 84 84 - e-mail: info@rothoblaas.com

**PROIECT**

**PRODUS** **NR. DE SERIE / AN**

**DATA ACHIZIȚIEI** **DATA PRIMEI UTILIZĂRI**

**INSPECȚIE PERIODICĂ A SISTEMULUI EFECTUATĂ ÎN DATA DE**

**PUNCTE DE CONTROLAT** **DEFECT IDENTIFICAT  
(Descrierea defectului / Măsurile)**

## DOCUMENTAȚIE

- ☐ INSTRUCȚIUNI DE MONTARE ȘI UTILIZARE
- ☐ DECLARAȚIE DE INSTALARE CORECTĂ
- ☐ PROCES VERBAL PENTRU ELEMENTE DE FIXARE
- ☐ DOCUMENTAȚIE FOTO

## PĂRȚI VIZIBILE ALE DISPOZITIVULUI DE ANCORARE

- ☐ FĂRĂ DEFORMĂRI
- ☐ FĂRĂ COROZIUNE
- ☐ CONEXIUNI PRIN ȘURUBURI STRÂNSE
- ☐ STABILITATE
- ☐ MARCAJE LIZIBILE

## IMPERMEABILITATEA ACOPERIȘULUI

- ☐ FĂRĂ DAUNE
- ☐ FĂRĂ COROZIUNE

### Rezultatul inspecției:

Instalația de siguranță respectă instrucțiunile de montare și utilizare ale producătorului și stadiul actual al tehnologiei. Se confirmă fiabilitatea în termeni de siguranță.

Note:

**Data prevăzută pentru următoarea inspecție:**

**Persoana expertă familiarizată cu sistemul de siguranță:**

**Nume:** **Semnătura:**
